

Descripción:

Modernización de 2 a 4 carriles en una longitud de 70.0 km, incluye la construcción de 4 entronques a desnivel, 2 puentes y 6 pasos superiores vehiculares.

- Meta total 70 km
- **Pendiente: 15 km**

Inversión Requerida:

544 mdp
PEF 100%

Tiempo de ejecución:

24 meses

Justificación:

- Eliminar cuellos de botella desde Ixmiquilpan, Hgo. hasta San Juan del Río, Qro.
- Disminuir tiempos de recorrido
- Reducir accidentes, ofreciendo mejores niveles de servicio, comodidad y seguridad para los usuarios, aumentando las velocidades y reduciendo Costos de Operación Vehicular.

Beneficios:



- 300,000 habitantes
- 6 Municipios
- Ahorro en tiempo de 20 min



Estatus:

- Proyecto Ejecutivo 50 %.
- DDV completo, a excepción de 2 puentes.
- MIA en proceso
- Aceptación social




Siguientes pasos:

- Recuperación de vigencia de Registro UI-SHCP
- Concluir obtención de la MIA
- Faltan proyectos de 2 puentes



Retos:

- Obtener asignación presupuestal por parte de la SHCP.

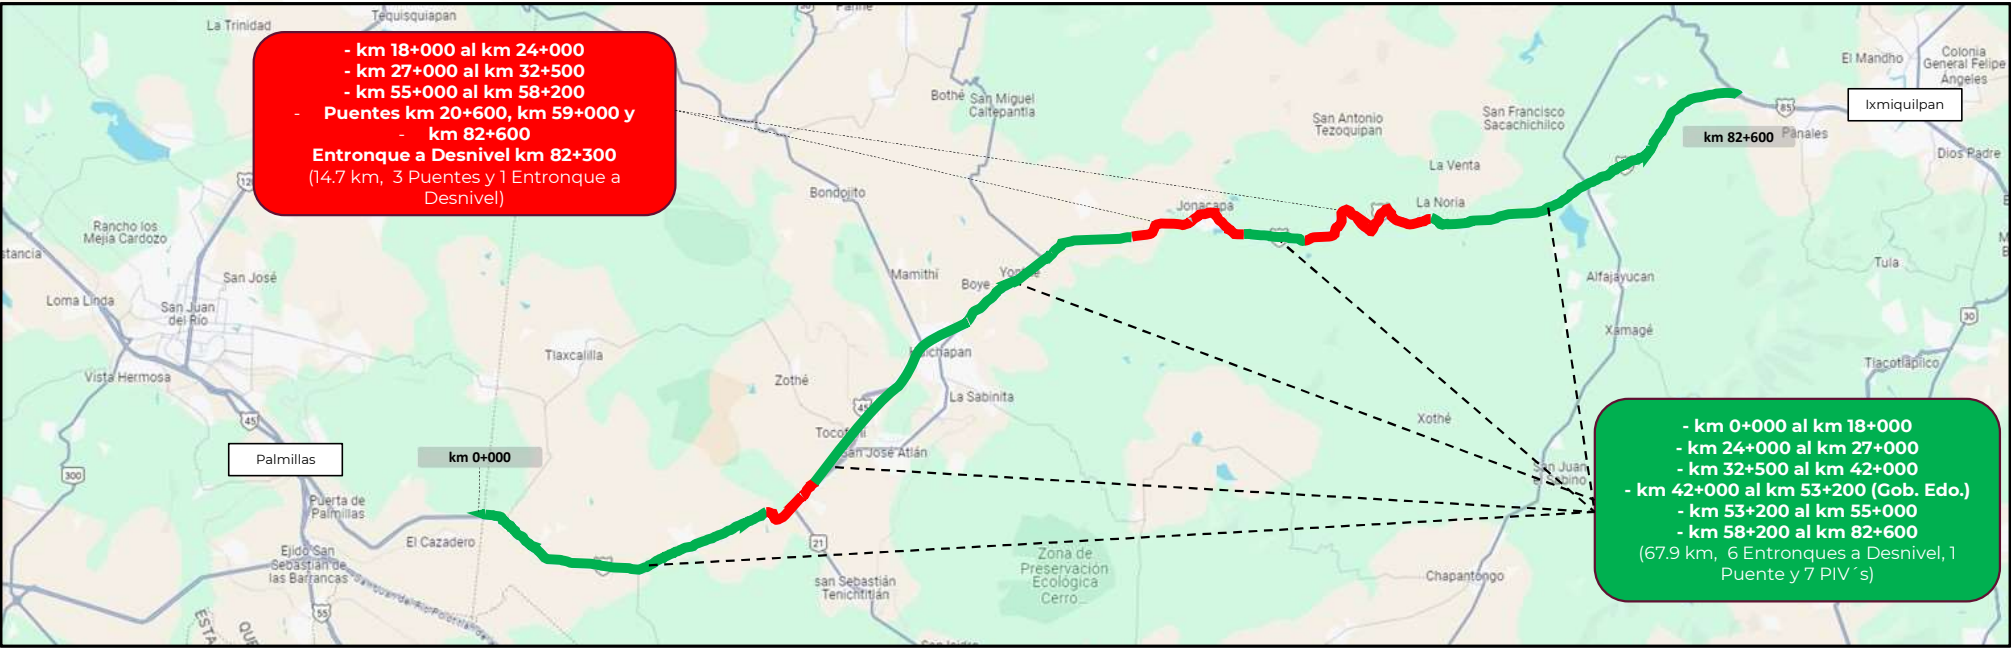

Modernizado



Por modernizar

